



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



# Acciones para el mantenimiento de la red vial 2025



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



## **Programación de proyectos aprobado por Consejo Consultivo para el año 2025 y presupuesto distribuido**



## INTEGRACION DE PROYECTOS 2025, APROBADOS POR CONSEJO CONSULTIVO

No.	DESCRIPCIÓN	ALCANCE ATENCIÓN KMS 2025	NO. PROYECTOS PROGRAMADOS 2025	MONTOS PROGRAMADOS
1	PROYECTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL PAVIMENTADA	6,347.84	85	Q 356,635,382.42
2	PROYECTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL DE TERRACERIA	4,768.82	72	Q 200,000,000.00
3	LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA		85	Q 150,000,000.00
4	MANTENIMIENTO DE PUENTES		22	Q 110,000,000.00
5	OBRA CIVIL		22	Q 125,000,000.00
6	SEÑALIZACION GENERAL		6	Q 80,000,000.00
7	DEFENSAS METALICAS		2	Q 40,000,000.00
8	PROYECTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA RED VIAL PAVIMENTADA (RECAPEO)		10	Q 71,250,000.00
9	SUPERVISION		154	Q 75,500,000.00
<b>Total Programado</b>		<b>11,117</b>	<b>458</b>	<b>Q 1,208,385,382.42</b>
(+ Un proyecto del año 2021, proyectos de los años 2022, 2023 y 2024 (DECRETOS 21-2022, 35-2022 y 50-2022) y proyectos ordinarios				Q 145,190,248.19
(+) procesos Judiciales				Q 80,116,149.39
(+ Funcionamiento				Q 29,259,220.00
<b>Total presupuesto 2025</b>				<b>Q 1,462,951,000.00</b>

Fuente: COVIAL



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



## Resumen de eventos adjudicados al 26/09/2025




	BACHEO	LIMPIEZA	TERRACERIA	OBRA CIVIL	PUENTES	SEÑALIZACION	DEFENSAS METÁLICAS	CP	SUPERVISION	TOTALES
ADJUDICADOS	65	72	66	20	14	3	0	9	120	369
DESIERTO	0	0	0	1	0	3	0	1	5	10
EN EVALUACION	6	9	6	1	4	0	0	0	1	27
OFERTA RECHAZADA	1	1	0	0	1	0	0	0	2	5
EN RECEPCION	0	3	0	0	0	0	2	0	0	5
AUSENCIA DE OFERENTES	5	0	0	0	3	0	0	0	2	10
CD POR AUSENCIA DE OFERENTES	8	0	0	0	0	0	0	0	24	32
PENDIENTE PUBLICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EVENTOS	85	85	72	22	22	6	2	10	154	458
CON CONTRATO APROBADO A LA FECHA	54	61	60	20	12	0	0	0	78	285

Fuente: COVIAL

\*Los eventos desierto en su mayoría, se deriva a que los oferentes incumplieron con requisitos fundamentales




## EVENTOS DE MANTENIMIENTO 2025

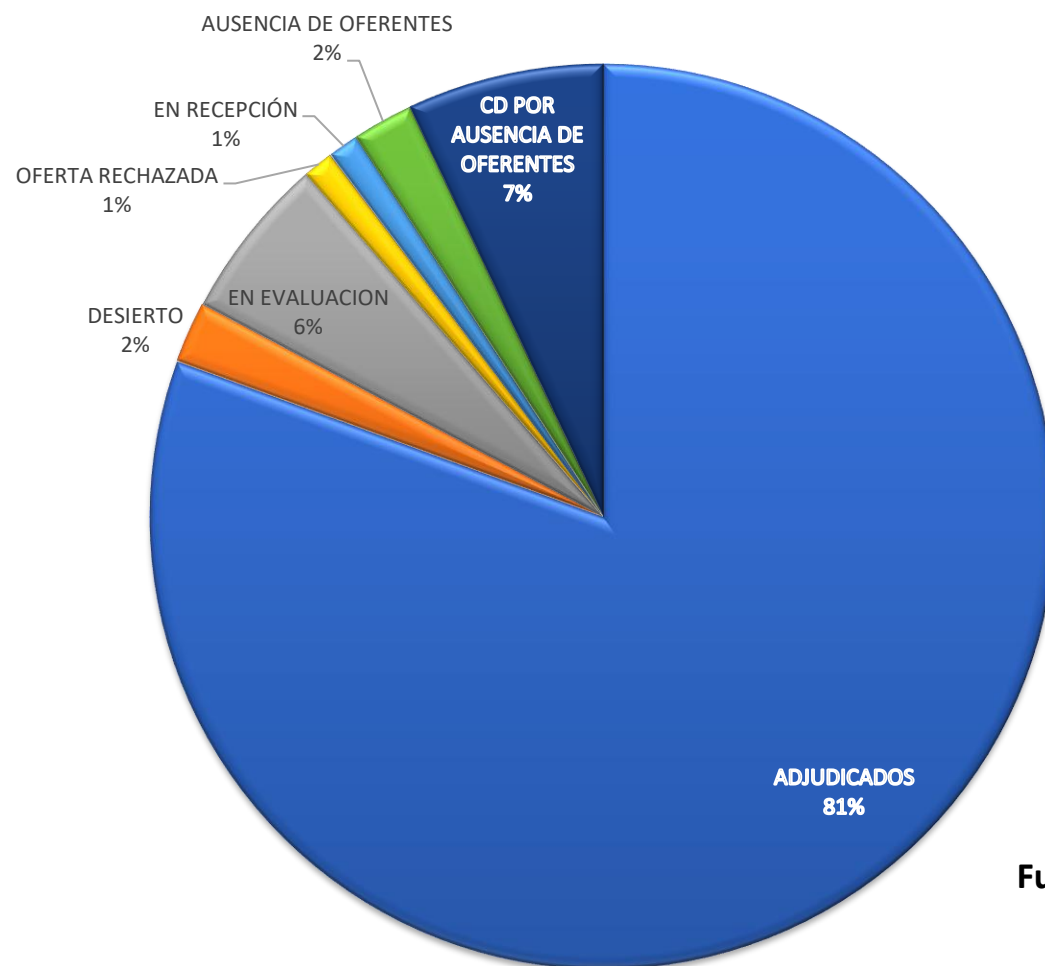

\*CD = Compra Directa

Fuente: COVIAL

## Adjudicaciones conforme al historico eventos

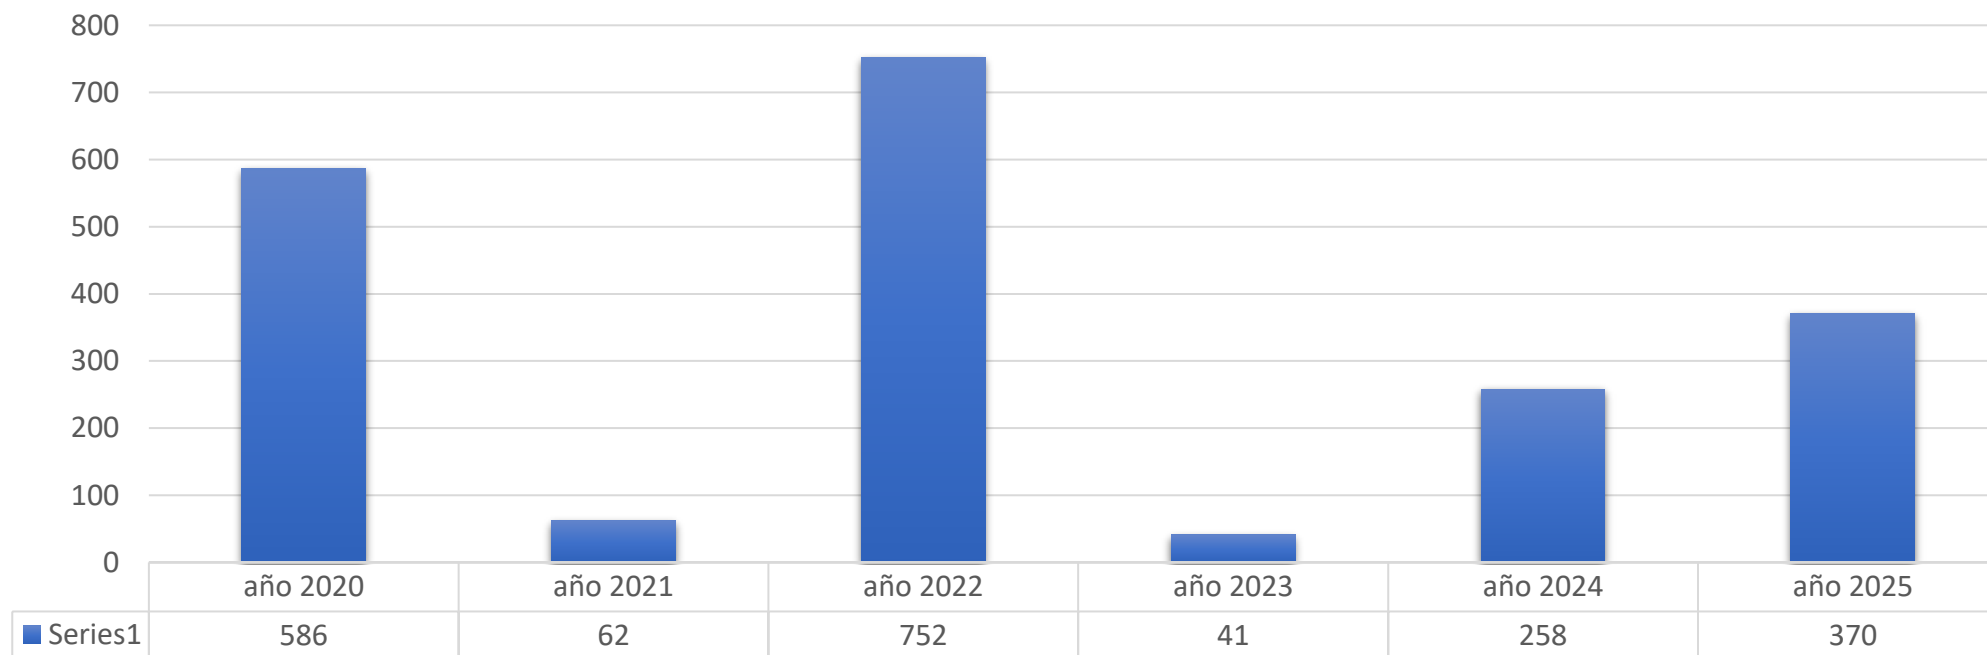


**Fuente:** COVIAL

\*En el año 2022 el número de evento aumenta significativamente derivado a la aprobación del Decreto 21-2022

\*\*Año 2025 datos al 26 de septiembre de 2025



## Adjudicación conforme al historico de presupuesto

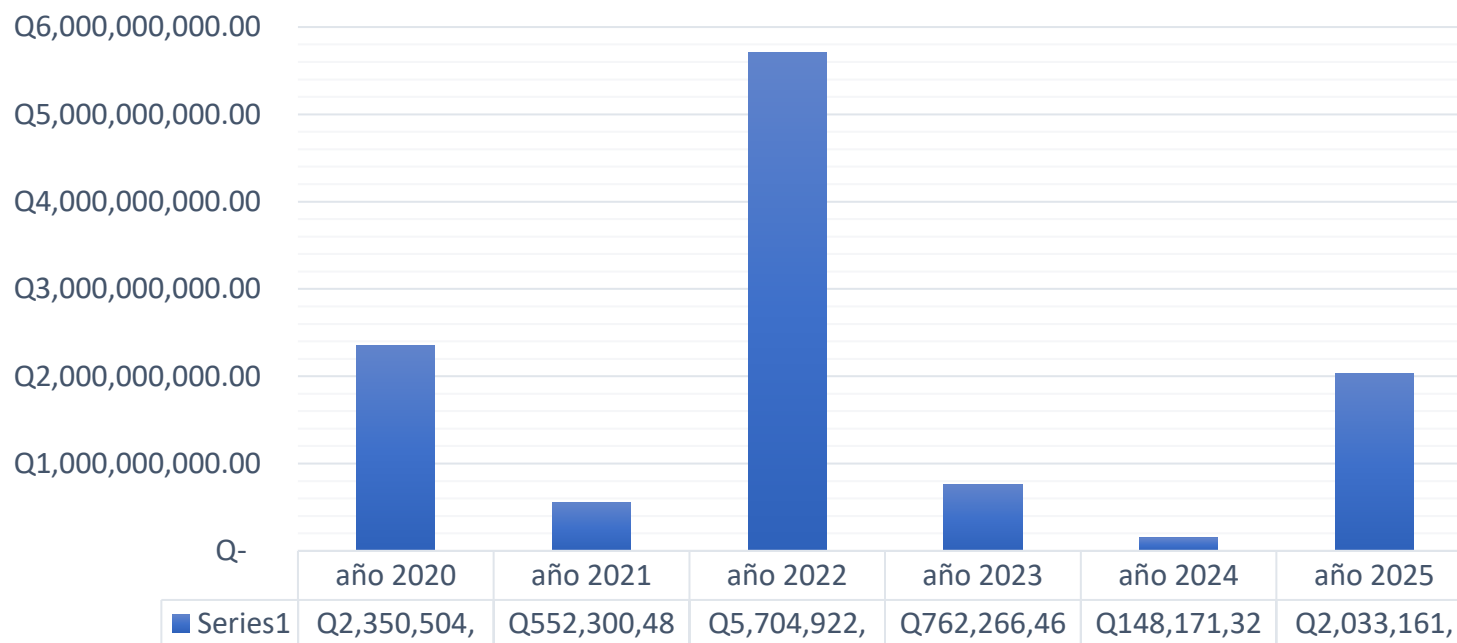

Fuente: COVIAL

**Las adjudicaciones de 2025 marcan una recuperación en el mantenimiento vial tras dos años sin intervenciones significativas, garantizando la atención de las necesidades acumuladas y el cuidado de la red hasta el primer semestre de 2026, antes de la temporada de lluvias.**

\*En el año 2022 el presupuesto aumenta significativamente derivado a la aprobación del Decreto 21-2022





Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



# Proyectos reactivados en el año 2025



En 2025, se han reactivado 166 proyectos de mantenimiento vial que datan del período 2022-2024, con una inversión ejecutada de Q297 millones. Esta acción ha permitido intervenir más de 400 puntos en la red vial de diversas regiones y departamentos del país. La reactivación de estos proyectos fue crucial para atender necesidades inmediatas y concluir los mantenimientos inconclusos previamente solicitados por la población, todo mientras se desarrollaba el proceso de adjudicación de los nuevos eventos programados para el año 2025.




Año	Proyectos	Monto Ejecutado (Q)	% del Total
2022	14	167,924,082.02	57%
2023	15	109,709,151.29	37%
2024	137	19,484,797.29	7%
Total	167	297,118,030.60	100%

Fuente: COVIAL



Título del gráfico

Departamento	Cantidad de atenciones
San marcos	71
Zacapa	54
Quetzaltenango	45
Baja Verapaz	31
Guatemala	31
Alta Verapaz	27
Sololá	20
Izabal	16
Santa rosa	14
Chimaltenango	19
Jalapa	12
El progreso	12
Multirregional	11
Escuintla	9
Chiquimula	8
El peten	18
Quiche	7
Totonicapán	2
Huehuetenango	5
Suchitepéquez	5
Jutiapa	4
Sacatepéquez	1

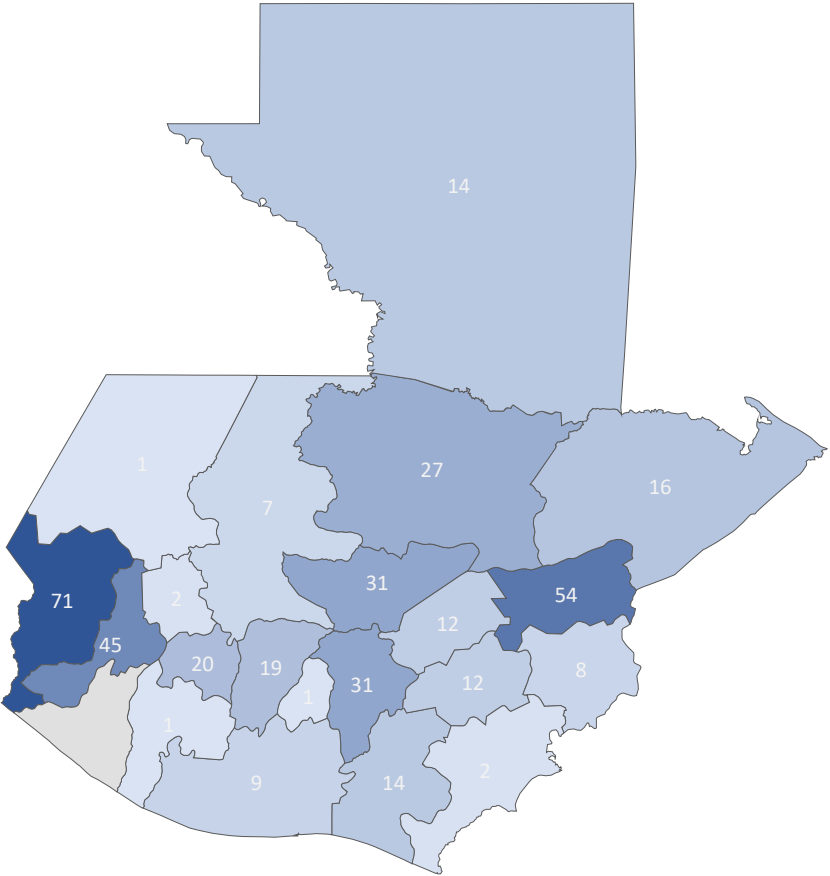

Con tecnología de Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Proyectos reactivados por departamento. Atendiendo 422 puntos a nivel nacional en el año 2025.



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



## **Proyectos Habilitados año 2025**

Se define como proyecto habilitado, todos aquellos que cuentan con contrato suscrito y aprobado mediante Acuerdo Ministerial para la empresa ejecutora y supervisora. Además de contar con bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas.



## Proyectos Habilitados año 2025

Tipo de Proyecto	Cantidad
Bacheo	24
Limpieza	22
Obra Civil	10
Mantenimiento de Puentes	8
Terracería	26
<b>Total</b>	<b>90</b>

**Fuente:** COVIAL, datos al 26/09/2025

No.	TIPO DE PROYECTO	DEPARTAMENTO	SUPERVISOR	STATUS	FECHA DE INICIO DE PROYECTO
1	B-016-2025	CHIQUIMULA	S-200-2025	HABILITADO	1/10/2025
2	B-021-2025	ESCUINTLA	S-202-2025	HABILITADO	10/09/2025
3	B-022-2025	ESCUINTLA	S-202-2025	HABILITADO	10/09/2025
4	B-024-2025	ESCUINTLA	S-203-2025	HABILITADO	8/09/2025
5	B-025-2025	ESCUINTLA	S-203-2025	HABILITADO	8/09/2025
6	B-028-2025	GUATEMALA	S-205-2025	HABILITADO	24/09/2025
7	B-030-2025	GUATEMALA	S-206-2025	HABILITADO	1/10/2025
8	B-031-2025	GUATEMALA	S-206-2025	HABILITADO	29/09/2025
9	B-032-2025	GUATEMALA	S-206-2025	HABILITADO	29/09/2025
10	B-033-2025	HUEHUETENANGO	S-207-2025	HABILITADO	29/09/2025
11	B-034-2025	HUEHUETENANGO	S-207-2025	HABILITADO	29/09/2025
12	B-037-2025	HUEHUETENANGO	S-209-2025	HABILITADO	29/09/2025
13	B-038-2025	HUEHUETENANGO	S-209-2025	HABILITADO	29/09/2025
14	B-039-2025	IZABAL	S-210-2025	HABILITADO	1/10/2025
15	B-043-2025	JUTIAPA	S-214-2025	HABILITADO	26/09/2025
16	B-044-2025	JUTIAPA	S-214-2025	HABILITADO	22/09/2025
17	B-045-2025	JUTIAPA	S-215-2025	HABILITADO	22/09/2025
18	B-046-2025	JUTIAPA	S-215-2025	HABILITADO	22/09/2025
19	B-066-2025	SAN MARCOS	S-224-2025	HABILITADO	1/10/2025
20	B-067-2025	SAN MARCOS	S-225-2025	HABILITADO	24/09/2025
21	B-068-2025	SAN MARCOS	S-225-2025	HABILITADO	24/09/2025
22	B-072-2025	SANTA ROSA	S-228-2025	HABILITADO	10/09/2025
23	B-083-2025	ZACAPA	S-235-2025	HABILITADO	1/10/2025
24	B-084-2025	ZACAPA	S-235-2025	HABILITADO	26/09/2025
25	L-010-2025	CHIMALTENANGO	S-197-2025	HABILITADO	1/10/2025
26	L-017-2025	CHIQUIMULA	S-200-2025	HABILITADO	En proceso de suscripción de acta de inicio
27	L-021-2025	ESCUINTLA	S-202-2025	HABILITADO	10/09/2025
28	L-022-2025	ESCUINTLA	S-202-2025	HABILITADO	10/09/2025
29	L-025-2025	ESCUINTLA	S-203-2025	HABILITADO	8/09/2025
30	L-030-2025	GUATEMALA	S-206-2025	HABILITADO	1/10/2025

**Fuente:** COVIAL



No.	TIPO DE PROYECTO	DEPARTAMENTO	SUPERVISOR	STATUS	FECHA DE INICIO DE PROYECTO
31	L-032-2025	GUATEMALA	S-206-2025	HABILITADO	25/09/2025
32	L-037-2025	HUEHUETENANGO	S-209-2025	HABILITADO	29/09/2025
33	L-039-2025	IZABAL	S-210-2025	HABILITADO	1/10/2025
34	L-041-2025	JALAPA	S-212-2025	HABILITADO	1/10/2025
35	L-042-2025	JALAPA	S-213-2025	HABILITADO	En proceso de suscripción de acta de inicio
36	L-043-2025	JUTIAPA	S-214-2025	HABILITADO	22/09/2025
37	L-045-2025	JUTIAPA	S-215-2025	HABILITADO	16/09/2025
38	L-046-2025	JUTIAPA	S-215-2025	HABILITADO	16/09/2025
39	L-059-2025	QUICHÉ	S-221-2025	HABILITADO	16/09/2025
40	L-060-2025	QUICHÉ	S-221-2025	HABILITADO	16/09/2025
41	L-065-2025	SAN MARCOS	S-224-2025	HABILITADO	24/09/2025
42	L-066-2025	SAN MARCOS	S-224-2025	HABILITADO	1/10/2025
43	L-067-2025	SAN MARCOS	S-225-2025	HABILITADO	24/09/2025
44	L-068-2025	SAN MARCOS	S-225-2025	HABILITADO	24/09/2025
45	L-069-2025	SAN MARCOS	S-226-2025	HABILITADO	29/09/2025
46	L-072-2025	SANTA ROSA	S-228-2025	HABILITADO	10/09/2025
47	OC-001-2025	ALTA VERAPAZ	S-101-2025	HABILITADO	8/09/2025
48	OC-002-2025	BAJA VERAPAZ	S-102-2025	HABILITADO	8/09/2025
49	OC-005-2025	EL PROGRESO	S-105-2025	HABILITADO	10/09/2025
50	OC-006-2025	ESCUINTLA	S-106-2025	HABILITADO	10/09/2025
51	OC-007-2025	GUATEMALA	S-107-2025	HABILITADO	8/09/2025
52	OC-012-2025	PETEN	S-112-2025	HABILITADO	16/09/2025
53	OC-013-2025	QUETZALTENANGO	S-113-2025	HABILITADO	En proceso de suscripción de acta de inicio
54	OC-014-2025	QUICHÉ	S-114-2025	HABILITADO	30/09/2025
55	OC-016-2025	SACATEPEQUEZ	S-116-2025	HABILITADO	24/09/2025
56	OC-017-2025	SAN MARCOS	S-117-2025	HABILITADO	25/09/2025
57	P-001-2025	ALTA VERAPAZ	S-123-2025	HABILITADO	8/09/2025
58	P-002-2025	BAJA VERAPAZ	S-124-2025	HABILITADO	En proceso de suscripción de acta de inicio
59	P-003-2025	CHIMALTENANGO	S-125-2025	HABILITADO	24/09/2025
60	P-005-2025	EL PROGRESO	S-127-2025	HABILITADO	En proceso de suscripción de acta de inicio



No.	TIPO DE PROYECTO	DEPARTAMENTO	SUPERVISOR	STATUS	FECHA DE INICIO DE PROYECTO
61	P-007-2025	GUATEMALA	S-129-2025	HABILITADO	1/10/2025
62	P-008-2025	HUEHUETENANGO	S-130-2025	HABILITADO	1/10/2025
63	P-015-2025	RETALHULEU	S-137-2025	HABILITADO	En proceso de suscripción de acta de inicio
64	P-016-2025	SACATEPEQUEZ	S-138-2025	HABILITADO	12/09/2025
65	T-001-2025	ALTA VERAPAZ	S-145-2025	HABILITADO	En proceso de suscripción de acta de inicio
66	T-002-2025	ALTA VERAPAZ	S-145-2025	HABILITADO	En proceso de suscripción de acta de inicio
67	T-003-2025	ALTA VERAPAZ	S-146-2025	HABILITADO	1/09/2025
68	T-004-2025	ALTA VERAPAZ	S-146-2025	HABILITADO	1/09/2025
69	T-005-2025	ALTA VERAPAZ	S-147-2025	HABILITADO	5/09/2025
70	T-006-2025	ALTA VERAPAZ	S-147-2025	HABILITADO	5/09/2025
71	T-011-2025	CHIMALTENANGO	S-150-2025	HABILITADO	1/10/2025
72	T-013-2025	CHIQUMULA	S-151-2025	HABILITADO	16/09/2025
73	T-014-2025	CHIQUMULA	S-152-2025	HABILITADO	22/09/2025
74	T-015-2025	CHIQUMULA	S-152-2025	HABILITADO	22/09/2025
75	T-020-2025	ESCUINTLA	S-156-2025	HABILITADO	10/09/2025
76	T-021-2025	GUATEMALA	S-157-2025	HABILITADO	1/09/2025
77	T-022-2025	GUATEMALA	S-157-2025	HABILITADO	1/09/2025
78	T-026-2025	IZABAL	S-161-2025	HABILITADO	10/09/2025
79	T-038-2025	PETEN	S-167-2025	HABILITADO	10/09/2025
80	T-039-2025	PETEN	S-167-2025	HABILITADO	10/09/2025
81	T-043-2025	QUICHE	S-171-2025	HABILITADO	30/09/2025
82	T-053-2025	SAN MARCOS	S-181-2025	HABILITADO	1/10/2025
83	T-061-2025	SANTA ROSA	S-188-2025	HABILITADO	16/09/2025
84	T-065-2025	SUCHITEPEQUEZ	S-190-2025	HABILITADO	En proceso de suscripción de acta de inicio
85	T-066-2025	SUCHITEPEQUEZ	S-190-2025	HABILITADO	En proceso de suscripción de acta de inicio
86	T-067-2025	TOTONICAPAN	S-191-2025	HABILITADO	1/10/2025
87	T-068-2025	TOTONICAPAN	S-191-2025	HABILITADO	1/10/2025
88	T-069-2025	TOTONICAPAN	S-191-2025	HABILITADO	1/10/2025
89	T-071-2025	ZACAPA	S-192-2025	HABILITADO	17/09/2025
90	T-072-2025	ZACAPA	S-192-2025	HABILITADO	17/09/2025



## Proyectos en proceso de habilitación año 2025

Tipo de Proyecto	Cantidad
Bacheo	9
Limpieza	9
Obra Civil	4
Mantenimiento de Puentes	1
Terracería	7
<b>Total</b>	<b>30</b>

Fuente: COVIAL

No.	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO	PROYECTO	STATUS
1	S-197-2025	CHIMALTENANGO	B-010-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
2	S-197-2025	CHIMALTENANGO	B-011-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
3	S-200-2025	CHIQUMULA	B-017-2025	PENDIENTE PAGO DE BITACORA
4	S-208-2025	HUEHUETENANGO	B-035-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
5	S-208-2025	HUEHUETENANGO	B-036-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
6	S-217-2025	PETÉN	B-051-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
7	S-224-2025	SAN MARCOS	B-065-2025	DOCUMENTOS CARGADOS CGC
8	S-226-2025	SAN MARCOS	B-069-2025	PENDIENTE PAGO DE BITACORA
9	S-226-2025	SAN MARCOS	B-070-2025	PENDIENTE PAGO DE BITACORA
10	S-199-2025	CHIQUMULA	L-014-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
11	S-200-2025	CHIQUMULA	L-016-2025	PENDIENTE PAGO DE BITACORA
12	S-207-2025	HUEHUETENANGO	L-033-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
13	S-208-2025	HUEHUETENANGO	L-035-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
14	S-217-2025	PETÉN	L-051-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
15	S-223-2025	SACATEPEQUEZ	L-063-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
16	S-223-2025	SACATEPEQUEZ	L-064-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
17	S-226-2025	SAN MARCOS	L-070-2025	PENDIENTE PAGO DE BITACORA
18	S-235-2025	ZACAPA	L-083-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
19	S-103-2025	CHIMALTENANGO	OC-003-2025	DOCUMENTOS CARGADOS CGC
20	S-115-2025	RETALHULEU	OC-015-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
21	S-118-2025	SANTA ROSA	OC-018-2025	PENDIENTE PAGO DE BITACORA
22	S-119-2025	SOLOLÁ	OC-019-2025	PENDIENTE PAGO DE BITACORA
23	S-141-2025	SOLOLÁ	P-019-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
24	S-148-2025	BAJA VERAPAZ	T-007-2025	DOCUMENTOS CARGADOS CGC
25	S-150-2025	CHIMALTENANGO	T-012-2025	DOCUMENTOS CARGADOS CGC
26	S-158-2025	HUEHUETENANGO	T-023-2025	DOCUMENTOS CARGADOS CGC
27	S-159-2025	HUEHUETENANGO	T-024-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
28	S-180-2025	SAN MARCOS	T-052-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
29	S-184-2025	SAN MARCOS	T-056-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR
30	S-192-2025	ZACAPA	T-070-2025	PENDIENTE DE RECIBIR DOCUMENTOS SUPERVISOR



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**

# Emergencias atendidas en año 2025

**RESUMEN DE EMERGENCIAS ATENDIDAS POR ZONA VIALES**  
**PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 28 SEPTIEMBRE DEL 2025**

ZONA VIAL No.	RODADURA/TALUD								PUENTE			OTRAS EMERGENCIAS	TOTAL
	DERRUMBES/ DESIZAMIENTO	DESOLVE	SOCAVAMIENTO	CAÍDA DE ÁRBOL	AZOLVAMIENTO	HUNDIMIENTO	DAÑO EN DRENAJES	CORTE DE CARRETERA	DAÑO MENOR EN PUENTE	DAÑO MAYOR EN PUENTE	COLAPSO DE PUENTE		
Zona Vial No. 1 Guatemala	24	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	28
Zona Vial No. 2 Jutiapa	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11
Zona Vial No. 3 Escuintla	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
Zona Vial No. 4 Retalhuleu	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	10
Zona Vial No. 5 Quetzaltenango	12	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	14
Zona Vial No. 6 Huehuetenango	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Zona Vial No. 7 Alta Verapaz	57	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	63
Zona Vial No. 8 Chiquimula	14	11	1	1	0	0	0	0	0	5	0	4	36
Zona Vial No. 9 San Marcos	3	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	7
Zona Vial No. 10 Petén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zona Vial No. 11 Izabal	2	0	0	4	0	0	0	0	0	5	0	0	11
Zona Vial No. 12 Chimaltenango	6	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1	14
Zona Vial No. 13 Quiché	16	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27
Zona Vial No. 14 Baja Verapaz	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Departamento de Asfaltos	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6
PLANTA CENTRAL D.G. C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	5
<b>TOTALES</b>	<b>163</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>253</b>



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**



# Proyectos de Alto Impacto Reactivados

## Dirección General de Caminos

Departamento	Municipio	Proyecto	Longitud	Estado	Avance Físico	Avance Financiero	Constructora	Contrato Constructora	Monto	Supervisora	Situación actual
SANTA ROSA	PUEBO NUEVO VIÑAS, BARBERENA	REHABILITACIÓN DE LA RUTA CA-01 ORIENTE-06, TRAMO: ENTRE DESVIO PUEBLO NUEVO VIÑAS Y BARBERENA, SANTA ROSA.	4.40	 EJECUCIÓN	75.77	75.77	COORDINADORA DE LOGISTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	048-2022-DGC-REHABILITACION	Q 65,565,229.85	CONSTRUCTORA TECNICA M.E. COTECPRO	EL PROYECTO SE REINICIO A PARTIR DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2025
IZABAL	LOS AMATES, MORALES, PUERTO BARRIOS	REHABILITACION DE LA RUTA CA-09 NORTE-18-19 TRAMO: ENTRE DESVIO A QUIRIGUA Y PUERTO BARRIOS, IZABAL	89.00	 EJECUCIÓN	92.85	89.99	CONSTRUCTORA CODICO, SOCIEDAD ANONIMA	045-2022-DGC-REHABILITACION	Q 435,531,550.56	CONSTRUCTORA SAN JUAN	EL PROYECTO SE REINICIO A PARTIR DEL 9 DE JUNIO 2025
CHIMALTENANGO	PATZICÍA, TECPÁN GUATEMALA	PROYECTO: REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-OCCIDENTE-08 TRAMO ENTRE PATZICIA Y LOS ENCUENTROS, CHIMALTENANGO.	39.00	 EJECUCIÓN	97.49	97.46	ASFALTOS Y PETROLEOS, SOCIEDAD ANONIMA	049-2022-DGC-REHABILITACION	Q 598,798,695.40	CONCAL	EL PROYECTO SE REINICIO A PARTIR DEL 13 DE JUNIO 2025
SUCHITEPÉQUEZ	CHICACAO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR NAHUALATE (PARALELO), RUTA CA-02-OCCIDENTE, EST. 136+400, CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ.	0.10	 EJECUCIÓN	37.58	14.20	CIANSA	016-2022-DGC-CALAMIDAD PÚBLICA	Q 49,090,215.05	B & T CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	EL PROYECTO SE REINICIO A PARTIR DEL 15 DE MAYO 2025
JALAPA	SAN CARLOS ALZATATE	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO: ACCESO MIRAMUNDO - LAGUNETA - SAN CARLOS ALZATATE - MORAZÁN ( INICIA EN KM 120+000 AL 150+000)	30.10	 EJECUCIÓN	30.41	30.41	SIGMA CONSTRUCTORES, S.A.	501-2006-DGC	Q 108,078,132.88	TECNOLOGÍA Y NORMAS, S.A.	EL PROYECTO SE REINICIO A PARTIR DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2025
PETÉN	SAYAXCHÉ	CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHÉ, RD PET-11, PETEN	4.95	 EJECUCIÓN	28.78	16.85	OPCIÓN TÉCNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	121-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q 668,247,519.28	HIDROC DE GUATEMALA, S. A.	PROYECTO REACTIVADO
HUEHUETENANGO	SANTA CRUZ BARILLAS	CONSTRUCCIÓN CARRETERA, TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RÍO ESPÍRITU, HUEHUETENANGO.	25.58	 EJECUCIÓN	52.42	42.49	PROYECTOS MÚLTIPLES PROURBA.	055-2020-DGC-CONSTRUCCION	Q 168,025,547.11	INPRO	EL PROYECTO SE REINICIO A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025
HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36, TRAMO: SAN MARTÍN CUCHUMATÁN - UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO.	9.72	 EJECUCIÓN	95.50	63.57	CONSTRUCTORA GALGO, S.A.	017-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q 106,396,366.02	CONSTRUCTORA CADSYC	EL PROYECTO SE REINICIO A PARTIR DEL 25 DE JULIO 2025
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, CONCEPCION HUISTA	MEJORAMIENTO CARRETERA, TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO	21.13	 EJECUCIÓN	58.41	52.68	OPCIÓN TÉCNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	047-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q 179,467,795.03	AC&A, S.A.	EL PROYECTO SE REINICIO A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2025



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**










# Proyectos en Ejecución

## Dirección General de Caminos





No	Departamento	Municipio	Proyecto	Longitud	Estado	Avance Físico	Avance Financiero	Constructora	Contrato Constructora	Monto Actualizado
1	SANTA ROSA	PUEBO NUEVO VIÑAS, BARBERENA	REHABILITACIÓN DE LA RUTA CA-01 ORIENTE-06, TRAMO: ENTRE DESVIO PUEBO NUEVO VIÑAS Y BARBERENA, SANTA ROSA.	4.40	🚧 EJECUCIÓN	75.77	75.77	COORDINADORA DE LOGISTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	048-2022-DGC-REHABILITACION	Q65,565,229.85
2	SAN MARCOS	OCÓS	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM-02 A BIFURCACIÓN RN-08 (HACIA OCÓS) - BIFURCACIÓN RD-SM-02 (HACIA TILAPA), OCÓS, SAN MARCOS	0.23	🚧 EJECUCIÓN	67.65	47.00	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	118-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q154,042,376.78
3	CHIMALTENANGO	PATZICÍA, TECPÁN GUATEMALA	PROYECTO: REHABILITACION DE LA RUTA CA-01-OCCIDENTE-08 TRAMO ENTRE PATZICIA Y LOS ENCUENTROS, CHIMALTENANGO.	39.00	🚧 EJECUCIÓN	97.49	97.46	ASFALTOS Y PETROLEOS, SOCIEDAD ANONIMA	049-2022-DGC-REHABILITACION	Q598,798,695.40
4	IZABAL	LOS AMATES, MORALES, PUERTO BARRIOS	REHABILITACION DE LA RUTA CA-09 NORTE-18-19 TRAMO: ENTRE DESVIO A QUIRIGUA Y PUERTO BARRIOS, IZABAL	89.00	🚧 EJECUCIÓN	92.85	89.99	CONSTRUCTORA CODICO, SOCIEDAD ANONIMA	045-2022-DGC-REHABILITACION	Q435,531,550.56
5	SUCHITEPÉQUEZ	CHICACAO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR NAHUALATE (PARALELO), RUTA CA-02-OCCIDENTE, EST. 136+400, CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ.	0.10	🚧 EJECUCIÓN	37.58	14.20	CIANSA	016-2022-DGC-CALAMIDAD PÚBLICA	Q49,090,215.05
6	BAJA VERAPAZ	CUBULCO	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA: RD-BVE-18: TRAMO: CHITOMAX - PACANI - CUBULCO, BAJA VERAPAZ	20.00	🚧 EJECUCIÓN	2.21	0.00	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	009-2024-DGC-CONSTRUCCION	Q130,819,598.95
7	HUEHUETENANGO	SANTA EULALIA, SAN SEBASTIÁN COATÁN	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS: RD HUE-03 TRAMO: BIF. RN-09 NORTE, ALDEA PET, SANTA EULALIA - SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO Y MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. RD HUE-04, SAN MIGUEL ACATAN. - BIF. RD HUE-03, SAN SEBASTIÁN COATAN, HUEHUETENANGO	21.10	🚧 EJECUCIÓN	19.86	9.72	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	010-2024-DGC-CONSTRUCCION	Q132,566,193.70
8	EL PROGRESO	SANSARE	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19, ANILLO C-50 TRAMO I: CA-9 NORTE - SANSARE, EL PROGRESO	14.00	🚧 EJECUCIÓN	0.00	0.00	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES SAN FRANCISCO	020-2023-DGC-CONSTRUCCION	Q664,528,798.16
9	JALAPA	SAN CARLOS ALZATATE	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO: ACCESO MIRAMUNDO - LAGUNETA - SAN CARLOS ALZATATE - MORAZÁN ( INICIA EN KM 120+000 AL 150+000)	30.10	🚧 EJECUCIÓN	30.41	30.41	SIGMA CONSTRUCTORES, S.A.	501-2006-DGC	Q108,078,132.88
10	SAN MARCOS	MALACATÁN, CATARINA, SAN JOSÉ EL RODEO	REHABILITACION CARRETERA RUTA RD-SM-10 TRAMO MALACATAN - BIF. CA-02 OCC, MALACATAN, SAN MARCOS A RUTA RD-SM-10, TRAMO: BIF.CA-02 OCC - ALDEA NICA, MALACTAN, SAN MARCOS A RUTA RD-SM-47, TRAMO: BIF. RN-13, FINCA LA ESPERANZA, SAN JOSE EL RODEO - BIF. RN-08, FINCA SAN JOSE, MALACATAN, SAN MARCOS A RUTA RN-08, TRAMO: BIF. RD-SM-47, LA MURALLA, MALACATAN - CATARINA, SAN MARCOS.	28.36	🚧 EJECUCIÓN	98.85	98.85	COAMCO	054-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q139,392,432.00

No	Departamento	Municipio	Proyecto	Longitud	Estado	Avance Físico	Avance Financiero	Constructora	Contrato Constructora	Monto Actualizado
11	ALTA VERAPAZ	SANTA CRUZ VERAPAZ, COBÁN	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA A 4 CARRILES RUTA CA-14, TRAMO: SANTA CRUZ VERAPAZ - COBÁN, ALTA VERAPAZ	12.00	 EJECUCIÓN	21.64	10.41	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES SAN FRANCISCO	128-2022-DGC-DISEÑO Y CONSTRUCCION	Q501,500,000.00
12	PETÉN	DOLORES	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06, TRAMO: BIF. CA-13 EST. 416.670, CASERÍO SABANETA - EST. 449.900, CASERÍO CALABAZAL, DOLORES, PETÉN	33.23	 EJECUCIÓN	23.55	22.68	TECNISOL	015-2023-DGC-CONSTRUCCION	Q344,820,866.15
13	PETÉN	SAYAXCHÉ	CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHÉ, RD PET-11, PETEN	4.95	 EJECUCIÓN	28.78	16.85	OPCIÓN TÉCNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	121-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q668,247,519.28
14	PETÉN	SANTA ANA	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO: BIF CA-13, SANTA ANA - ALDEA EL MANGO, SANTA ANA, PETEN	16.28	 EJECUCIÓN	50.14	39.19	CONSTRUCTORA PETÉN	029-2023-DGC-CONSTRUCCION	Q96,306,000.00
15	JALAPA	JALAPA	CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA, JALAPA	11.45	 EJECUCIÓN	60.63	52.45	CONCISA	012-2023-DGC-CONSTRUCCION	Q121,800,000.00
16	HUEHUETENANGO	SANTA CRUZ BARILLAS	CONSTRUCCIÓN CARRETERA, TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RÍO ESPÍRITU, HUEHUETENANGO.	25.58	 EJECUCIÓN	52.42	42.49	PROYECTOS MÚLTIPLES PROURBA.	055-2020-DGC-CONSTRUCCION	Q168,025,547.11
17	HUEHUETENANGO	SANTA BARBARA	PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11, TRAMO: BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO	7.50	 EJECUCIÓN	78.94	76.67	CONSTRUCTORA DIMAPROC	072-2023-DGC-DISEÑO Y CONSTRUCCION	Q62,650,000.00
18	ESCUINTLA	GUANAGAZAPA	AMPLIACIÓN CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-ESC-09 Y CA-2 OR ANILLO C-50 TRAMO VIII: GUANAGAZAPA - ESCUINTLA, ESCUINTLA.	17.20	 EJECUCIÓN	51.95	47.09	CIANSA	023-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q699,810,858.12
19	PETÉN	LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-12 DEL TRAMO: LAS CRUCES-PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN, SUBTRAMO: BIF. CR-PET-06 (EST. 458+800) - BIF. CR-PET-12 (EST. 479+200), PETEN.	20.47	 EJECUCIÓN	70.61	64.55	MAYA PAV, SOCIEDAD ANONIMA	008-2022-DGC-C	Q202,274,020.44
20	CHIMALTENANGO	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	31.00	 EJECUCIÓN	69.16	64.24	SCM	072-2020-DGC-CONSTRUCCION	Q213,529,298.04



No	Departamento	Municipio	Proyecto	Longitud	Estado	Avance Físico	Avance Financiero	Constructora	Contrato Constructora	Monto Actualizado
21	QUICHÉ	NEBAJ	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27, TRAMO: SALQUIL GRANDE-NEBAJ, NEBAJ, QUICHE	23.50	EJECUCIÓN	84.80	81.30	PROYECTOS SAMARIA	020-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q221,968,971.30
22	HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36, TRAMO: SAN MARTÍN CUCHUMATÁN - UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO.	9.72	EJECUCIÓN	95.50	63.57	CONSTRUCTORA GALGO, S.A.	017-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q106,396,366.02
23	SANTA ROSA, JUTIAPA	BARBERENA, CUILAPA, SAN JOSÉ ACATEMPA, JUTIAPA, PROGRESO JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA, ATESCATEMPA, ORATORIO, JALPATAGUA, PASACO, MOYUTA	REHABILITACIÓN DE LA RUTA CA-1 ORIENTE, TRAMO: EL MOLINO-SAN CRISTÓBAL FRONTERA Y CONSTRUCCION DE UN CARRIL ADICIONAL EN EL SUB-TRAMO: EL MOLINO-ALDEA LLANO GRANDE Y ACCESO EL PROGRESO JUTIAPA (CA-01 ORIENTE) - JALAPA SOBRE LA RUTA RN-19	63.00	EJECUCIÓN	94.34	75.36	H W CONTRACTORS, S. A. Y LANELLO	305-2007-DGC-CONSTRUCCION	Q477,769,868.89
24	ALTA VERAPAZ	LANQUÍN	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-07, TRAMO: LANQUÍN - SEMUC CHAMPEY LANQUÍN, ALTA VERAPAZ	10.00	EJECUCIÓN	99.55	80.25	MAYA MIX	129-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q145,970,016.20
25	SAN MARCOS	MALACATÁN, SAN PABLO, SAN RAFAEL PIE DE A CUESTA, ESQUIPULAS PALO GORDO	REHABILITACION CARRETERA RUTA RD-SM-44 TRAMO BIF. RN-01 SAN MARCOS - BIF. RN-01 ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS A RUTA RN-01, TRAMO: SAN MARCOS - SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS A RUTA RN-01, TRAMO: BIF. RN-13 - SAN PABLO, SAN MARCOS RUTA RN-01 TRAMO: SAN PABLO - SUBESTACION ELECTRICA INDE, MALACATÁN, SAN MARCOS A RUTA RN-01, TRAMO: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA INDE, MALACATÁN - BIF. CA-02 OCCIDENTE, MALACATÁN, SAN MARCOS.	45.52	EJECUCIÓN	97.44	97.44	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES, S. A.	053-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q279,528,660.00
26	SAN MARCOS	SAN MARCOS	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RN-12 SUR Y RD-SM-30, TRAMO: BIFURCACIÓN RD-SM-28, SAN RAFAEL GUATIVIL - SINTANÁ, SAN MARCOS	29.72	EJECUCIÓN	53.79	50.97	CIANSA	125-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q229,337,973.97
27	HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, CONCEPCION HUISTA	MEJORAMIENTO CARRETERA, TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO	21.13	EJECUCIÓN	58.41	52.68	OPCIÓN TÉCNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	047-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q179,467,795.03
28	BAJA VERAPAZ	CUBULCO	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	0.27	EJECUCIÓN	95.48	87.16	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	071-2022-DGC-CONSTRUCCION	Q216,887,968.70



Ministerio de  
**Comunicaciones,  
Infraestructura y  
Vivienda**
